

가조 어촌관광단지 조성사업

□ 목 적

- 잊혀져 가는 수산문화 계승과 관광 인프라 구축 어촌관광활성화
- 낙후된 도서관광 자원화로 어촌소득 향상 및 지역균형 발전

□ 사업개요

- 위 치 : 거제시 사등면 창호리 2080번지 일원
- 사업기간 : 2012년 ~ 2014년(3년간)
- 사업량 : 7,370m²
- 공 정 율 : 20%(‘13. 6월말 기준)

□ 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기투자	2012년	2013년		2014년 이후
				기집행	미집행	
계	57.0	-	1.00	2.26	3.73	50.01
국 비	30.0	-	0.50	1.20	1.80	26.50
도 비	8.1	-	0.25	0.29	0.61	6.95
시 비	18.9	-	0.25	0.77	1.32	16.56

※ 투자계획은 2013년 6월말 기준으로 작성하였으며 향후 재정 여건에 따라 변동될 수 있음


□ 추진상황 및 향후계획

- ‘11.07.15. : 주민 추진위원회 구성(17명) - 자문, 사업지원
- ‘12.04.20. : 기본계획 및 실시설계 시행 - 지명경쟁 입찰방식
- ‘13.09.20. : 도시 관리 계획 및 공원계획 수립
- ‘13.10.10. : 현장착공
- ‘13.10.20. : 전시공사 착공
- ‘14.12.30. : 준공

□ 사업 효과

- 수협발상지리는 역사적 배경을 바탕으로 관광자원화 및 야외 학습장 활용
- 가조연륙교와 연계한 새로운 관광자원 개발로 지역경제 활성화 도모

□ 위치도

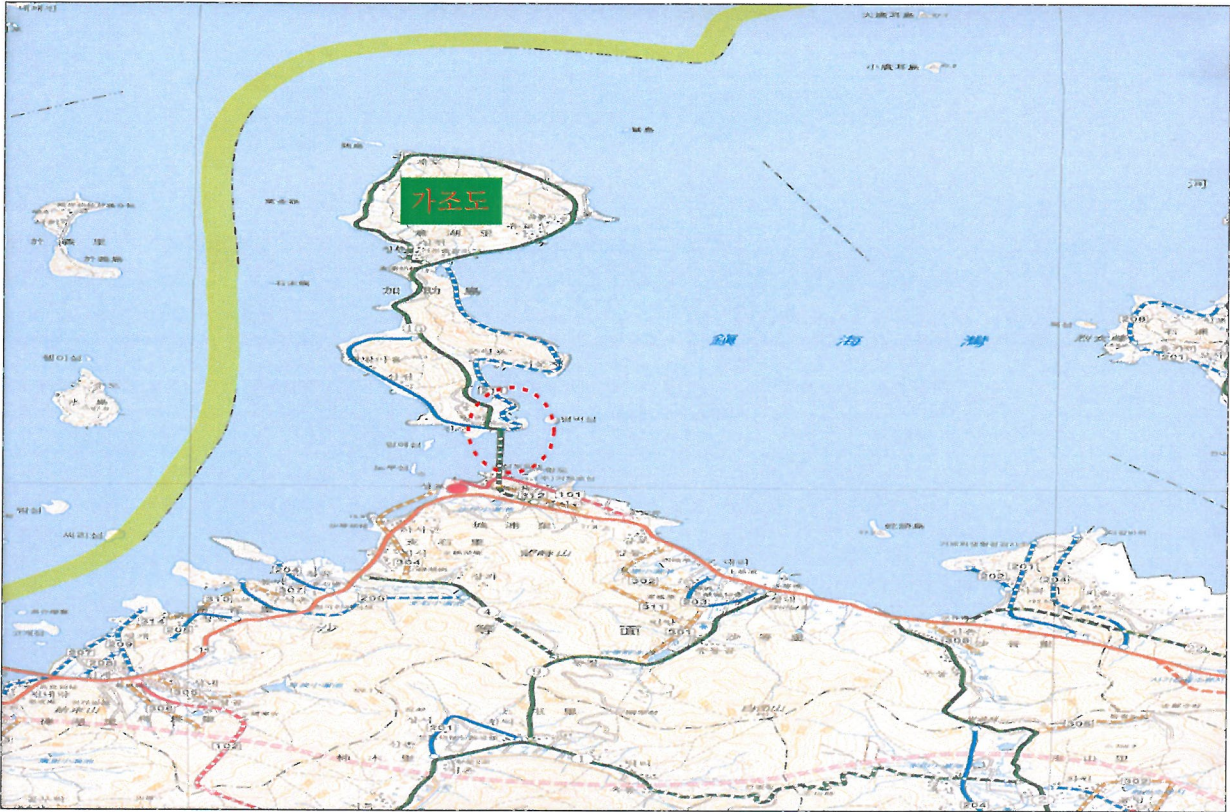

□ 현장사진

