

# 아주도시계획도로(대로3-3호선) 개설

## □ 목 적

- 도시계획도로 개설로 도시기반시설 확충 및 교통체증 해소

## □ 사업개요

- 위 치 : 거제시 아주동 지내(국도14호선~대동다숲APT)
- 사업기간 : 2011년 ~ 2015년(5년간)
- 사업량 : 도로개설(교량가설) L=424m, B=17.0~30.m(RC라멘교 등)
- 공 정 율 : 0%(‘13. 6월말 기준)

## □ 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투 자	2012년	2013년		2014년이후
				기집행	미집행	
계	110	38			22.5	49.5
국 비						
도 비	12.5				12.5	
시 비	97.5	38			10.0	49.5

※ 투자계획은 2013년 6월말 기준으로 작성하였으며 향후 재정 여건에 따라 변동될 수 있음


## □ 추진상황 및 향후계획

- ‘12.11.30. : 도시계획시설사업 실시계획인가 신청
- ‘13.02.19. : 편입 토지 등 보상협의 완료
- ‘13.05.28. : 감리 용역 계약심사 요청
- ‘13.07.19. : 공사 착공
- ‘13.09. . : 감리 발주
- ‘15.07.18. : 공사 및 감리 준공(예정)

## □ 사업 효과

- 아주지구 도시개발사업 및 대규모 아파트단지 건립으로 인구 밀집지역으로 변모함에 따라 미개설 구간인 아주 도시계획도로 대로3-3호선을 국도대체 우회도로에 접속하여 아주지역 주간선 도로 체계를 완성하여 교통체증 해소

## □ 위치도

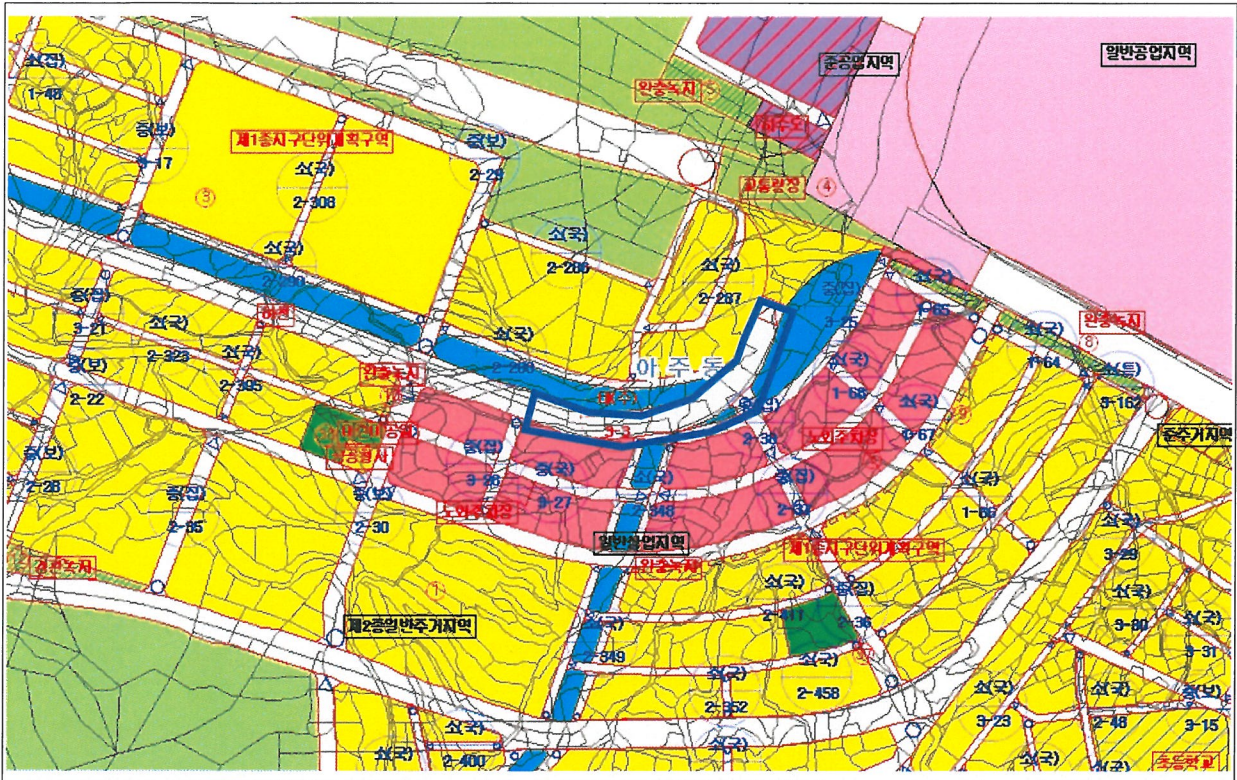

## □ 현장사진

