

옥포도시계획도로(소로2-374호선) 개설

□ 목 적

- 도시계획도로 개설로 도시기반시설 확충 및 교통체증 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 거제시 옥포동 985-3번지 일원(한신아파트 부근)
- 사업기간 : 2011.08. ~ 2014.04.
- 사업량 : 도로개설 L=160m, B=8.0m
- 공 정 율 : 0%(‘13. 6월말 기준)

□ 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투 자	2012년	2013년		2014년이후
				기집행	미집행	
계	10	4	1		2	3
국 비						
도 비						
시 비	10	4	1		2	3

※ 투자계획은 2013년 6월말 기준으로 작성하였으며 향후 재정 여건에 따라 변동될 수 있음


□ 추진상황 및 향후계획

- ‘11.10.14. : 손실보상가 재감정 실시
- ‘12.02.20. : 손실보상협의 추진
- ‘12.05.30. : 지방토지수용위원회 수용재결 신청
- ‘12.10.18. : 토지수용재결 결정에 따른 손실보상금 위탁
- ‘13.03.20. : 이의재결 결정에 따른 손실보상금 공탁
- ‘13.08. . : 공사 착공
- ‘14.02. . : 공사 완료

□ 사업 효과

- 옥포동 지역의 도시기반시설 확충 및 주민통행 불편 해소

□ 위치도

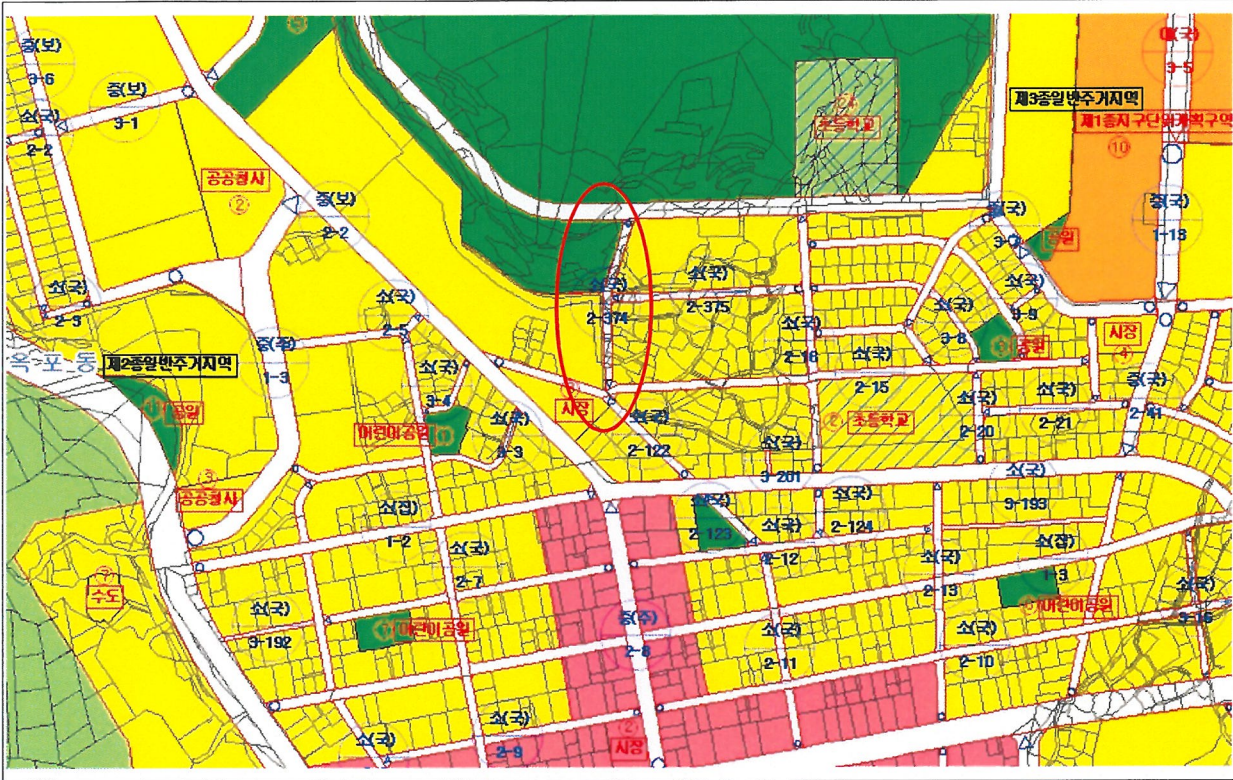

□ 현장사진

