

국내도 장평램프 연결도로 개설

□ 목 적

- 거가대교 개통이후 국도14호선 구 신현읍 시가지 교통량 집중됨에 따라 국도대체우회도로를 통한 인구 밀집지역(장평동 덕산아내아파트 등) 교통량 분산

□ 사업개요

- 위 치 : 거제시 장평동 국도대체우회도로 3공구 ~ 거제공고
- 사업량 : 도로 L=411m. B=11.5m
- 사업기간 : 2011년 ~ 2016년(6년간)
- 공 정 율 : 편입토지 보상협의

□ 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투 자	2012년	2013년		2014년 이후
				기집행	미집행	
계	70	0	7	0	0	63
국 비						
도 비						
시 비	70	0	7			63

※ 투자계획은 2013년 6월말 기준으로 작성하였으며 향후 재정 여건에 따라 변동될 수 있음


□ 추진상황 및 향후계획

- '11. 05. : 조사측량 및 실시설계용역 완료
- '11. 12. : 편입토지 보상계획 공고
- '12. 04. : 편입토지 감정평가
- '13. 06. : 편입토지 보상(보상 협의율 48%)
- '14. 06. : 보상완료 및 공사착공
- '16. 12. : 공사완료

□ 사업 효과

- 국도대체우회도로 계룡산 교차로(장평램프)설치로 국도14호선 장평동지역 교통체증 해소

□ 위치도

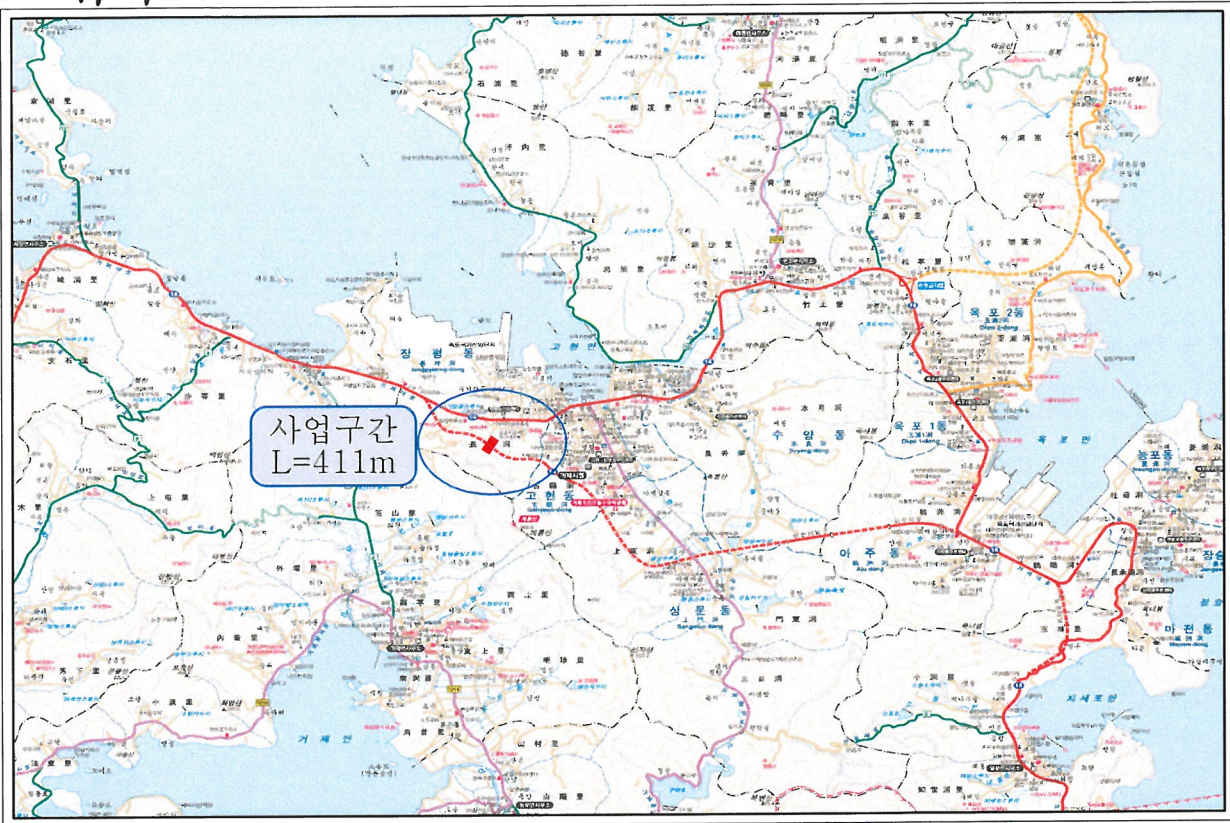

□ 현장사진

