

근포 요트계류시설 조성

□ 목 적

- 관광·레저·스포츠가 연계된 복합형 패키지 관광수요에 대한 인프라 구축

□ 사업개요

- 위 치 : 거제시 남부면 근포·대포항 일원
- 사업기간 : 2010년~2015년(6년간)
- 사업량 : 부유식파제제154m, 호안215m(매립9,946m), 계류시설 수리소, 클럽하우스2층 1동, 주차장75대, 상하가시설, 슬립웨이 등
- 공 정 율 : 35%(‘13. 6월말 기준)

□ 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투 자	2012년	2013년		2014년 이후
				기집행	미집행	
계	135	24	26	0.8	5.2	79
국 비	50	10	10	0.4	2.6	27
도 비	15	2	3	0.1	0.9	9
시 비	70	12	13	0.3	1.7	43

※ 투자계획은 2013년 6월말 기준으로 작성하였으며 향후 재정 여건에 따라 변동될 수 있음


□ 추진상황 및 향후계획

- ‘08. 03. 31 : 타당성 및 기본계획 수립
- ‘11. 11. 14 : 부유식파제제 준공
- ‘13. 01. 30 : 토목·건축공사 준공(매립9,946m²)
- ‘13. 06~‘13. 08 : 2차공사 대비 관급자재(강관, 폰툰) 구입
- ‘14. 06. : 계류시설공사 착준공
- ‘14. 12. : 부대시설공사 착준공(클럽하우스, 상하가시설, 슬립웨이)

□ 사업 효과

- 해양관련 산업 유치 및 고용창출로 지역경제 활성화에 기여
- 일반인, 가족단위 해양체험 공간제공으로 해양레포츠 중심도시 선점

□ 위치도

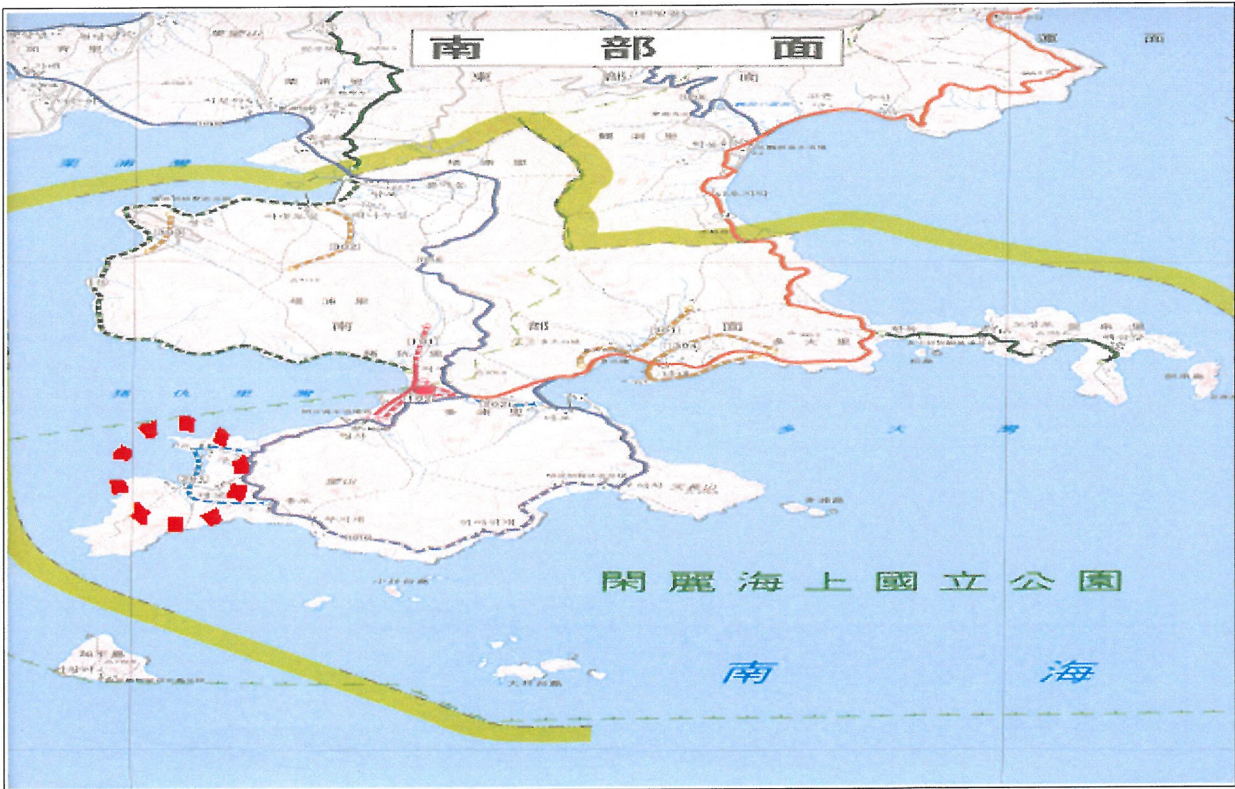

□ 현장사진

